

なかぐしくうどうん  
**中城御殿跡地整備検討委員会**

**第 3 回**

第 3 回委員会：3 月 16 日（水）10：00～

**【資料 3】次年度以降の検討事項、整備スケジュール（案）**

1. 今後の整備予定について（案）
2. 施工計画（案）
3. 整備スケジュール（案）
4. 次年度以降の検討事項

# 1. 今後の整備予定について（案）

令和3年度の基本計画の改定を踏まえ、中城御殿の整備においては、以下のとおり検討を進める。

## ■施工計画、整備スケジュール（案）

- 中城御殿の整備は、エリア別に整備を進め、令和8（2026）年の首里城正殿復元工事完成予定の際に、一部エリアの公開（供用開始）を目指す。
- 施工手順を踏まえ、第1期「上之御殿エリア」、第2期「御内原エリア・表御殿西側エリア」、第3期「表御殿東側エリア」の順序で整備に向けた取組（設計・工事等）を進める。
- 整備事業の各段階で生じる検討課題については、設計・工事段階においても、引き続き整備検討委員会での確認を踏まえることとし、整備内容に反映する。
- 整備の過程においては、安全性を確保の上、工事状況の情報発信や現地説明会等を行い、エリアごとの段階的な整備や公開を通し、広く整備の様子を県民へ伝えられるように努める。

## ■令和4（2022）年度の検討について

- 第1期「上之御殿エリア」及び松崎馬場・龍潭一帯について、整備検討委員会での検討を踏まえながら、設計等を進める。

### 【上之御殿エリア】

- 上之御殿エリアの設計に関する事項（遺構の公開・表現手法、庭園・平場・園路等の整備、脇門等の修復等）


### 【松崎馬場・龍潭一帯等】

- 松崎馬場の整備（園路、植栽整備等）の検討
- 龍潭一帯の修景整備について

※第2期の「御内原エリア・表御殿西側エリア」においても、段階的に検討を進める。

## 2. 施工計画（案）

第1期：上之御殿エリア、第2期：御内原エリア・表御殿西側エリア、第3期：表御殿東側エリアを予定。

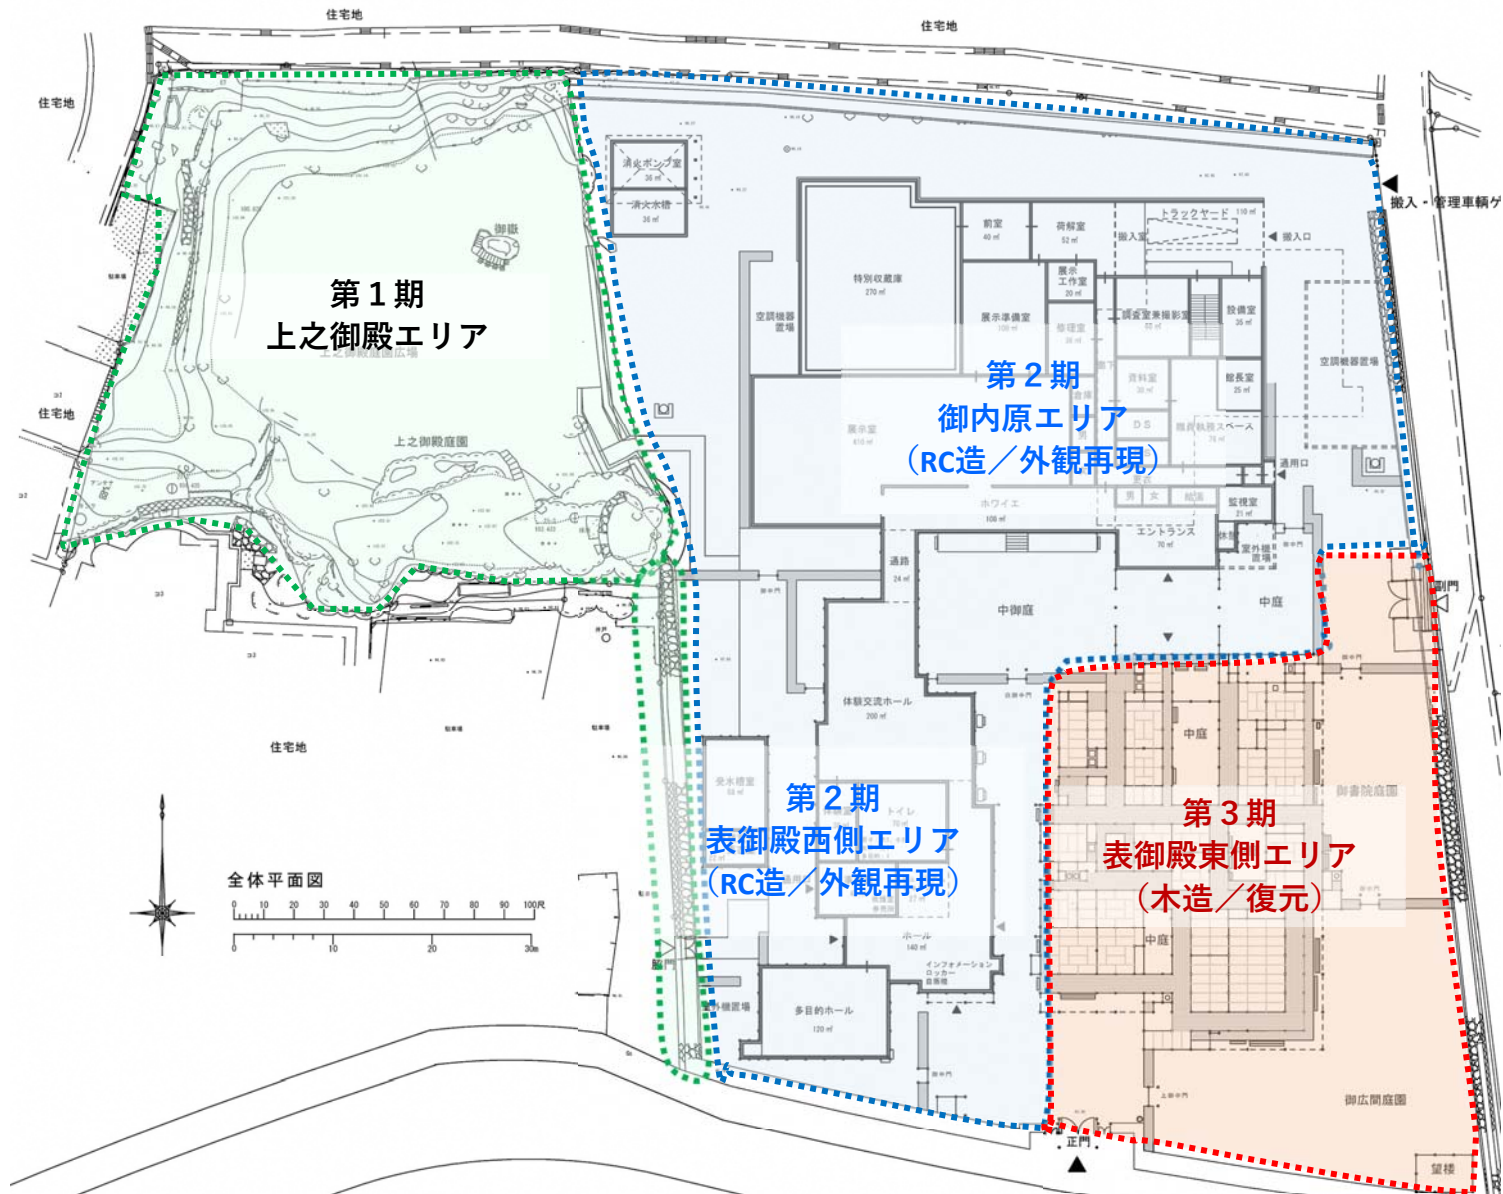

### 3. 整備スケジュール (案)

	項目	事業	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
城郭内	正殿復元	国営公園事業	実施設計	発注手続 (WTO)		工事		正殿完成	※城郭内スケジュール 令和2年3月公表 「首里城正殿等の復元等に向けた工程表」参照					
関連事業	円覚寺跡整備	文化庁 国庫補助事業	三門整備工事											
中城御殿	松崎馬場など 龍潭周辺整備	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)	基本計画改定	松崎馬場など龍潭周辺整備 調整、設計			工事			公開 (供用開始)				
	【第1期工事】 上之御殿 (庭園・広場)	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)		上之御殿 設計	工事			公開 (供用開始)						
	【第2期工事】 御内原 表御殿西側 (RC造)	社会資本整備 総合交付金事業 (公園事業)		御内原・表御殿西側 設計 ※時期調整中	工事			公開 (供用開始)						
	【第3期工事】 表御殿東側 (木造復元)	事業化に向け 引き続き調整			表御殿東側 設計				木材調達、本体工事					

◁令和8年 首里城正殿復元工事完成予定

## 4. 次年度以降の検討事項

### ①建物区域（表御殿東側エリア/表御殿西側エリア/御内原エリア）

本計画改定を踏まえ、美術工芸品等の展示・収蔵環境及び防災・防火対策の強化、並びに歴史的風致景観への配慮を視野にいれながら、建物及び庭園等の設計を行う。御広間庭園及び御書院庭園、敷地内の瓦石垣及び工作物等においても、建物の設計とあわせて詳細を検討する。

### ②上之御殿区域（上之御殿エリア）

発掘調査の成果を踏まえ、遺構（庭園・石積み等）の適切な保護・活用の方法について、引き続き検討を行った上で、設計を行う。また、歴史的空間の再現のための植栽等についても検討を行う。

### ③首里城公園全体における役割分担の調整

公園全体の一体的利用と魅力向上を図るためにも、城郭内と中城御殿との役割分担について、国との連携のもと検討する。

### ④管理運営の検討

中城御殿に必要な管理体制について、首里城公園内の一体的な管理運営と指定管理者制度の活用を前提とした管理体制の強化を検討する。

### ⑤松崎馬場・龍潭一帯の整備方法の検討

松崎馬場の敷地境界を整理し、園路及び植栽の整備の検討・設計を行う。また、龍潭周辺の修景についても検討・設計を行う。

### ⑥公園範囲の都市計画変更

那覇市の中細街路の都市計画決定変更や、松崎馬場の敷地境界の整理などを踏まえて、首里城公園の範囲について都市計画を変更する。また、中城御殿からの眺望景の確保や周辺地域を含めた歴史的風致が促進するよう、関係者との調整や連携を行う。
